

Plano Verão

2023 / 2024

6|5 anos



AÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO

Serviços de Água

- ☐ **Manutenção Preditiva nos Pontos de Pressão do Município;**
- ☐ **Novo Ponto de Pressão no Bairro Samambaia;**
- ☐ **Descargas Preventivas do Sistema de Distribuição de Água;**
- ☐ **Combate a perdas;**
- ☐ **Reforço de rede (Prolongamentos, Duplicação de Redes e interligações);**



Serviços de Esgoto

- ☐ **Lavagem Preventiva de Rede Coletora de Esgotos;**
- ☐ **Limpeza Preventiva das Estações Elevatórias de Esgoto;**
- ☐ **Manutenção das Estações Elevatórias de Esgoto;**



AÇÕES PREVISTAS PARA O VERÃO




Água

- ☐ **Contratação de 03 Carros Pipas (além dos utilizados em nossa Frota)**
- ☐ **05 – Funcionários Temporários**
- ☐ **Manutenção preventivas da EEATs do CR Melvi e Boosters Ocian e São Vicente**
- ☐ **Manter Operando os Pontos de Pressão Existentes**
- ☐ **Limpeza das Captações do Melvi pelo RSTA**
- ☐ **Reforço de abastecimento através do Sistema integrado**



Esgoto

- ❑ **Limpeza das Elevatórias do Município**
- ❑ **03 – Funcionários Temporários**
- ❑ **Manutenção preventiva de Todas as EEEs**
- ❑ **03 caminhões de desobstrução de rede e ramal de esgoto**





OBRAS DE INVESTIMENTOS

Empreendimentos (Programa Onda Limpa)



ETA-MELVI



Início: julho/2021

Término: setembro/2024

Contratada: Consórcio Melvi BS (Allonda – Cosatel)


Valor (PO): R\$ 61,2 milhões

Escopo	Prev.	Exec.
Estação de Tratamento de Água Compacta	1.270 l/s	-



Situação atual: CONTRATO RESCINDIDO.
Executado 6% físico (limpeza de terreno,
aterro compactado na cota) .

EPCs 1 e 2 - PRAIA GRANDE

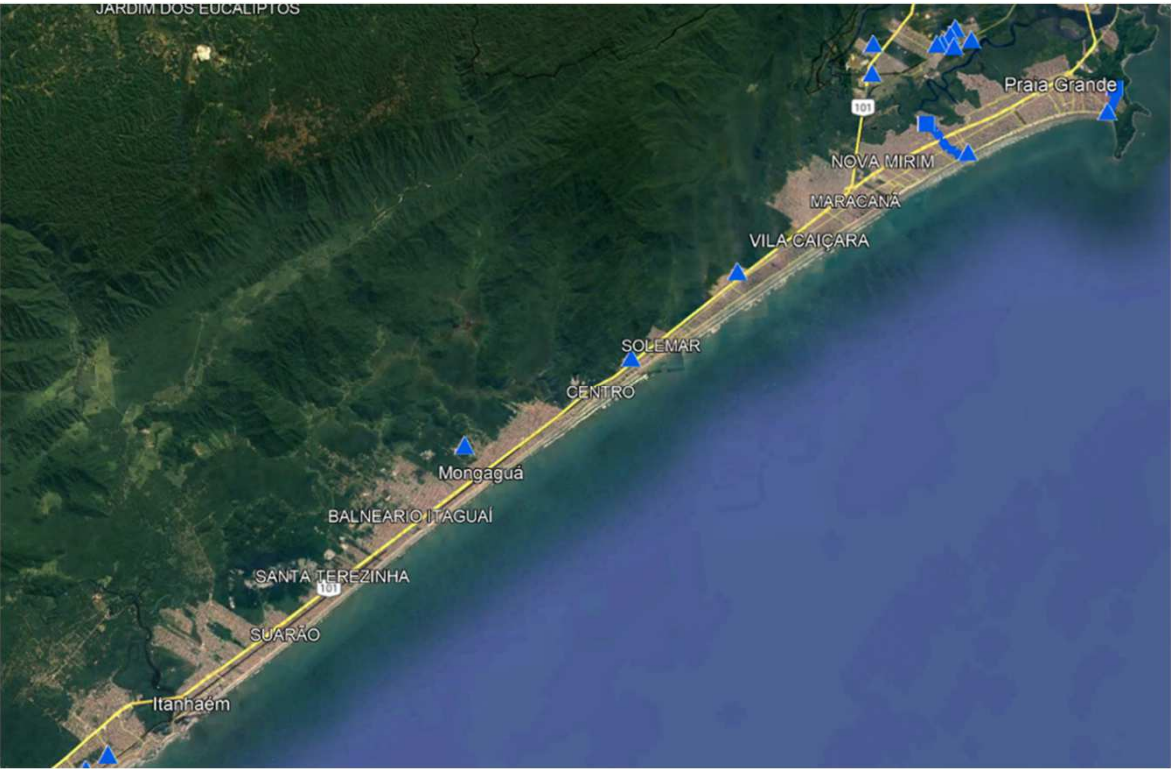

■ Realizado ■ A Realizar

Situação atual : em execução – sistemas em fase de Operação Assistida

Início: 13/11/2018

Término: 30/09/2023

Contratada: Consórcio CMR4 – Augusto Velloso

Valor (P0): R\$ 341,2 milhões

Escopo	Prev.		Exec.	
-	Subsistema 1 (Canto do Forte)	Subsistema 2 (Tupi)	Subsistema 1 (Canto do Forte)	Subsistema 2 (Tupi)
Estação de Pré-condicionamento (1.380 L/s)	1 un	1 un	1 un	1 un
Estação Elevatória Inicial	1 un	1 un	1 un	1 un
Estação Elevatória de Esgoto Final (área da EPC)	1 un	1 un	1 un	1 un
Emissário Terrestre (Ø 1.200 mm)	2.328 m	4.440 m	2.126 m	4.204 m
Emissário Submarino (prolongamento)	650 m	650 m	650 m	650 m



SES Trevo/Melvi - sub-bacias 1 e 2



Início: março/2020

Término: julho/2023

Contratada: JOFEGE Pavimentação e Construção

Valor (P0): R\$ 47,1 milhões

Escopo	Prev.	Exec.
Redes	40 km	36,9 km
LR	4,1 km	4,26 km
EEE's	2 EEE's 1 torre de carga	2 EEE's 1 torre de carga
Ligações	3.477	1.777



■ Realizado ■ A Realizar

Situação atual: Em andamento atividades para conclusão da efetiva conexão das ligações de esgoto, previsão de término em 15/10/2023.



CANTO DO FORTE - JARDIM GLÓRIA - Remanejamento REDE COLETORA



Início: junho/2023

Término: junho/2026

Contratada: Zigurate Construção LTDA

Valor (P0): R\$ 39,7 milhões

Escopo	Prev.	Exec.
Redes	23,7 km	-
LR	1,9 km	-
Coletor Tronco	1,4 km	-
Ligações	2.677	-



Situação atual: em execução – A.S. emitida em 18/08/23. Em andamento mobilização de canteiro e aquisição de materiais, para início da Bacia 01 em Setembro/23.



FORÇA DE AÇÃO



FORÇA DE AÇÃO

CONTINGENTE

- ❑ **Funcionários Contratados LOWE – 7 Funcionários (Desobstruções e Lavagens de RCE)**
- ❑ **Funcionários Contratados JOFEGE – 30 Funcionários**
- ❑ **Funcionários Próprios – 41 Funcionários (Incluindo 8 Temporários)**
- ❑ **Extensão de horário de atendimento durante o Natal e Final de Ano**

FORÇA DE AÇÃO

EQUIPAMENTOS

- ❑ Caminhões Tanque – 05 Unidades (sendo 02 contratados)
- ❑ Caminhões Desobstrução – 03 Unidades (sendo 02 contratados)
- ❑ Retroescavadeiras – 04 Unidades (sendo 03 contratados)



**SÃO
PAULO**
GOVERNO
DO ESTADO



15 | **5** anos

